



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร โทร. ๐๗๗-๔๓๙๑๑๔

ที่ พิเศษ/๒๕๖๕ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑

เรียน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่ง อบต.พ่วงพรมครที่ ๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญคอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงแจ้งกำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมตรวจรับงานจ้างโดยพร้อมเพรียงกัน

(ลงชื่อ)

(นายถวิล เงินสีเหม)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

รับทราบแล้ว


นางสาวรารพร ฮวดกุล.....

นายอุทัย พลพิชัย.....



นายไพรัช สังข์ตวง.....

นายประมวล คงเปีย.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี
 วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง

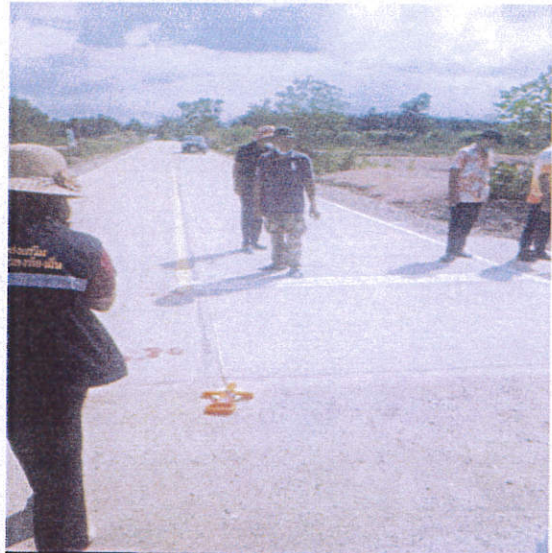

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ก่อสร้าง

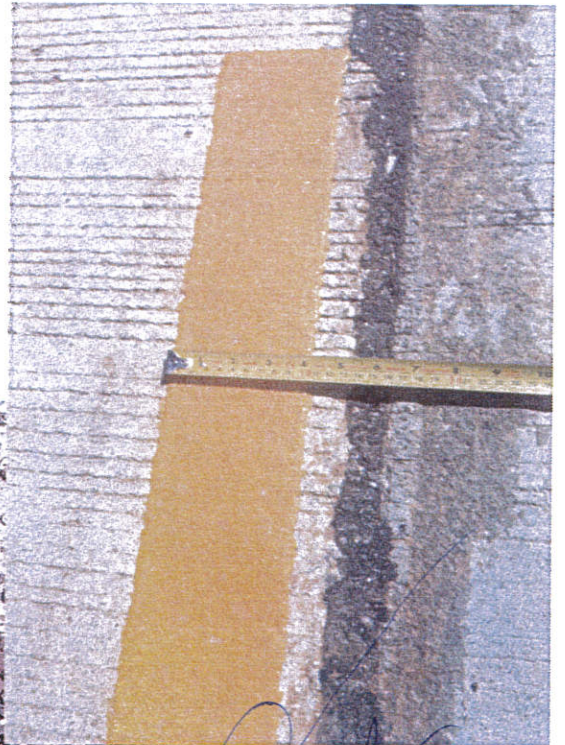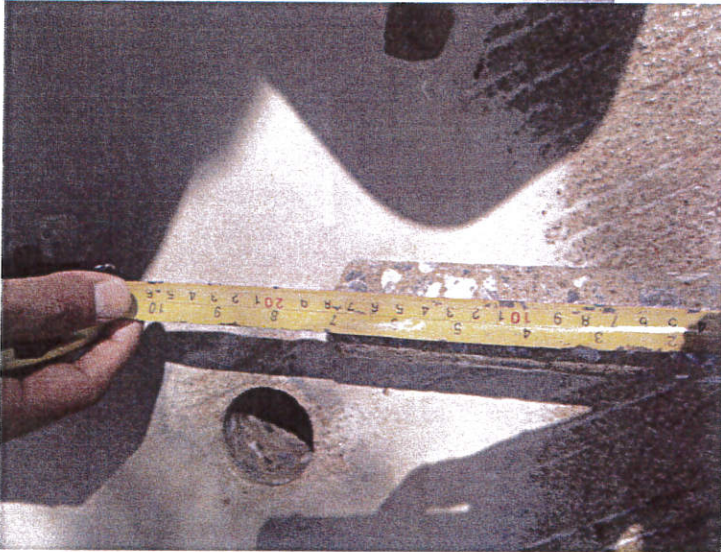

Handwritten signatures and text in blue ink, including the name "สุวิทย์" (Suwit).

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี

ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑.....

๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๔.๑.....

๔.๒.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ที่ พิเศษ/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามคำสั่ง อบต.พ่วงพรมคร ที่ ๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น


ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา ไหล่ทาง งานวางท่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ และมีดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร และได้ตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 


(นายถวิล เงินสีเหม)

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) 

(นางสาววราพร ฮวดกุล)

ตำแหน่ง กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายไพรัช สังข์ต๋วง)

ตำแหน่ง กรรมการ

(ลงชื่อ) 

(นายอุทัย พลพิชัย)


ตำแหน่ง กรรมการ


(ลงชื่อ) 

(นายประมวด คงเปีย)

ตำแหน่ง กรรมการ

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่



เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) 

(นางชวัลยีน ไทยถนนอม)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล




(ลงชื่อ).....

(นายถวิล เงินสีเหม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล








(ลงชื่อ).....

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี
ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอกะเนียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายถวิล เงินสีเหม	ปลัด อบต.		ประธานกรรมการ
๒	นายอุทัย พลพิชัย	นักวิชาการศึกษานาญการ		กรรมการ
๓	นางสาววราพร ฮวดกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		กรรมการ
๔	นายไพรัช สังข์ด้วง	ประชาคมหมู่บ้าน		กรรมการ
๕	นายประมวล คงเปีย	ประชาคมหมู่บ้าน		กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายฐานะ ช่วยสงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง		ผู้ควบคุมงาน

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี -

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายถวิล เงินสีเหม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ได้กล่าวเปิดประชุมโดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายถวิล เงินสีเหม ประธานกรรมการฯ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ที่ ๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย

๑. นายถวิล เงินสีเหม ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
๒. นางสาววราพร ฮวดกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชก. กรรมการ
๓. นายอุทัย พลพิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชก. กรรมการ
๔. นายไพรัช สังข์ด้วง ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ
๕. นายประมวล คงเปี้ย ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจการงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ซึ่ง หจก.สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ได้แจ้งเข้าดำเนินงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น ซึ่งได้แจ้งคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทางเดิม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อทดสอบการผิวจราจร พร้อมเก็บตัวอย่างคอนกรีต ไปแล้วนั้น

ซึ่ง หจก.สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ได้ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตามหนังสือ หจก.สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง ที่ SCE ๒๕๖๕/๐๓๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

กระผมในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้นำตรวจงานในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการก็ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความกว้าง ความยาว ความหนา งานวางท่อระบายน้ำ บ้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้างดังกล่าว และได้นัดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. เพื่อหาข้อสรุปตามข้อเท็จจริงที่ได้ตรวจสอบในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น และมอบหมายให้ นางสาววราพร ฮวดกุล เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี

นายถวิล เงินสีเหม
ประธานกรรมการ

ตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมี
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้รับจ้าง ตาม
สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เริ่มสัญญา ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการตาม
สัญญา จำนวน ๖๐ วัน

รายละเอียดโครงการ

ตามสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปรึกษา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยทำการเกรด เคลี่ยขึ้นพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% พร้อมลงทรายหยาบอัดแน่น รองพื้นทาง คิดเป็นปริมาตรทรายหยาบไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร คสล. คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๔.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขนาด $\text{O } ๐.๘๐ \times ๑.๐๐$ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทลาด คสล. หน้าและหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่น ๆ ตามรายการประมาณราคาก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียด ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด

ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบงานจ้าง และแจ้งว่างานแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ประชานกรรมการได้แจ้งนัดให้เข้าตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง คณะกรรมการจึงได้ออกตรวจงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันและเวลาดังกล่าว

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

- (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
- (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
- (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
- (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่
ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปถ่ายการละเอียดและ
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะ
งวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑
ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปถ่ายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
ให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (๖)

นายถวิล เงินสีเหม
ประธานกรรมการฯ

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้ลงตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นระยะๆ ตามที่ผู้ควบคุมงานตามโครงการได้แจ้งให้ทราบ
ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ลงติดตามจำนวน ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะกรรมการได้ลง
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่า
วิทยาลัยเทคนิคพังงา ได้ลงทดสอบความหนาแน่นของชั้นพื้นทางเดิม เจาะ
ทดสอบความหนาแน่นชั้นพื้นทางเดิม จำนวน ๓ จุด
- ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการ
ได้ลงตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ผู้รับ
จ้างจะดำเนินการเทคอนกรีตพร้อมเก็บตัวอย่างคอนกรีต
- สำหรับครั้งที่ ๓ เป็นการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน
จ้างและ ผลปรากฏว่า

- ๑) ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ซึ่งคณะกรรมการได้วัดทุกระยะ ๕๐ เมตร
ปรากฏว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการ
- ๒) ขนาดความยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร ซึ่งคณะกรรมการได้วัดความยาวได้
๓๗๐.๘๐ เมตร ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบรายการ
- ๓) ขนาดความหนา ซึ่งคณะกรรมการได้เจาะความหนา จำนวน ๔ จุด
ปรากฏว่า จุดที่ ๑ ที่ระยะทาง ๓๑ เมตร วัดได้ ๐.๑๙ เมตร จุดที่ ๒ ที่ระยะทาง
๑๒๕ เมตร วัดได้ ๐.๑๘ เมตร จุดที่ ๓ ที่ระยะทาง ๒๒๕ เมตร วัดได้ ๐.๑๕ เมตร
จุดที่ ๔ ที่ระยะทาง ๓๒๕ เมตร วัดได้ ๐.๑๖ เมตร ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบรายการ
- ๔) ขนาดความกว้างไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ซึ่ง
คณะกรรมการได้วัดทุกระยะทาง ๕๐ เมตร ปรากฏว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการ

๕) งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ขนาด $\text{O } ๐.๘๐ \times ๑.๐๐$ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทลาด คสล. หน้าและหลังท่อ จากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการ

๖) ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เป็นไปตามรูปแบบรายการ

จากผลการทดสอบของแท่งตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ตามที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ทำการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตถนน คสล. จำนวน ๓ ก้อน อายุ ๗๖ วัน กำลังอัดเฉลี่ยเฉลี่ย ๒๕๗.๕๑ กก./ซม. กำลังอัดที่เฉลี่ยที่กำหนด ๒๔๐ กก./ซม. รายละเอียดตามหนังสือ ที่ SCE ๒๕๖๕/๐๓๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดแท่งลูกบาศก์คอนกรีต

นายฉวีล เงินสีเหม
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีก็ขอถามมติในที่ประชุมว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี หรือไม่

มติที่ประชุม

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเห็นควรรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทราบและทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จดยางงานการประชุม

(นางสาวรวราพร ฮวดกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉวีล..เงินสีเหม)

ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้ดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยפרปา หมู่ที่ ๑ บ้านควนสามัคคี ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยชั้นพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕ % พร้อมลงทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นทาง คิดเป็นปริมาตรทรายหยาบไม่น้อย ๑๑๐.๗๐ ลูกบาศก์เมตร ผิวจราจร คสล. คิดเป็นปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๑๐ ลูกบาศก์เมตร หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๔.๐๐ ตารางเมตร งานวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ขนาด $\text{O } ๐.๘๐ \times ๑.๐๐$ เมตร จำนวน ๑ จุด รวมท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมเทาด คสล. หน้าและหลังท่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดอื่นๆ ตามรายการประมาณราคาการก่อสร้าง แบบแปลน แบบรูป รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมครกำหนด นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้าง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ คอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริง ได้ส่งมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร จึงได้กำหนดวันตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเรวัตน์ แก้วประกอบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร

